

浙江三喜广告装饰有限公司
年产 5 万米立体字、1 万米展示架项目
竣工环境保护验收监测表

QX(竣)20220417

建设单位：浙江三喜广告装饰有限公司

编制单位：浙江齐鑫环境检测有限公司

二〇二二年四月

建设单位法人代表： 王根伟

编制单位法人代表： 蒋国龙

项目负责人： 吴学良

报告编写人： 吴学良

建设单位：浙江三喜广告装饰有限公司

电话：18005786888

传真：/

邮编：323000

地址：丽水经济技术开发区枫岭街8号

编制单位：浙江齐鑫环境检测有限公司

电话：0578-2303512

传真：0578-2303507

邮编：323000

地址：浙江省丽水市莲都区丽南花苑1幢三层

目录

表一 建设项目概况.....	1
表二 验收执行标准.....	3
表三 工程建设内容.....	5
表四 主要污染源、污染物处理和排放措施.....	13
表五 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定.....	17
表六 验收监测质量保证及质量控制.....	20
表七 验收监测内容.....	22
表八 验收监测结果.....	24
表九 验收监测结论.....	30
附件一：项目环评批复.....	33
附件二：排污许可登记.....	37

表一 建设项目概况

建设项目名称	年产5万米立体字、1万米展示架项目				
建设单位名称	浙江三喜广告装饰有限公司				
建设项目性质	新建				
建设地点	丽水经济技术开发区枫岭街8号				
主要产品名称	广告装饰字、架				
设计生产能力	5万米字、1万米架				
实际生产能力	5万米字、1万米架				
环评文件类型	环境影响报告表				
建设项目环评时间	2019年8月	开工建设时间	2019年10月		
投入试生产时间	2021年5月	验收监测时间	2022年4月15日-16日		
环评报告表编制单位	丽水市环科环保咨询有限公司	环评报告表审批部门及文号	丽水市生态环境局 (丽环建[2019]81号)		
环保设施设计、施工单位	/				
投资总概算	200万元	环保投资总概算	26万元	比例	13%
实际总投资	200万元	实际环保投资	20万元	比例	10%
验收监测依据	<p>(1) 《中华人民共和国环境保护法》(2015.1.1施行)；</p> <p>(2) 《中华人民共和国水污染防治法》(2018.1.1施行)；</p> <p>(3) 《中华人民共和国大气污染防治法》(2018.10.26修订)；</p> <p>(4) 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018.12.29修订2022.06.05实施《中华人民共和国噪声污染防治法》)；</p> <p>(5) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2020.04.09修订版)；</p> <p>(6) 《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》中华人民共和国国务院令(第682号)(2017.7.16发布)；</p> <p>(7) 关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告(国环规环评[2017]4号)；</p> <p>(8) 《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》；</p> <p>(9) 《浙江省建设项目环境保护管理办法》，省政府令第388号，2021.2.10修正；</p>				

<p>验收监测依据</p>	<p>(10) 《关于建设项目环保设施验收有关事项的通知》浙江省环境保护厅，浙环办函〔2017〕186号；</p> <p>(11) 丽水市生态环境局《关于浙江三喜广告装饰有限公司年产5万米立体字、1万米展示架项目环境影响报告表的审批意见》（丽环建[2019]81号），2019年9月10日；</p> <p>(12) 《浙江三喜广告装饰有限公司年产5万米立体字、1万米展示架项目环境影响报告表》，丽水市环科环保咨询有限公司，2019年8月；</p>
---------------	---

表二 验收执行标准

验收监测评价标准、标号、级别、限值	一、废水				
	项目生活废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；其中氨氮、总磷排放执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）相关要求；具体标准限值见表 2-1，表 2-2。				
	表 2-1 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 中表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 单位：除 pH 外，mg/L				
	序号	污染物	适用范围	三级标准	
	1	pH值	一切排污单位	6~9（无量纲）	
	2	悬浮物	其它排污单位	400	
	3	化学需氧量	其它排污单位	500	
	4	五日生化需氧量	其他排污单位	300	
	5	石油类	一切排污单位	20	
	6	动植物油	一切排污单位	100	
表 2-2 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013） 单位：mg/L					
序号	污染物项目	适用范围	间接排放限值	污染物排放监控位置	
1	氨氮	其它企业	35	企业废水总排放口	
2	总磷	其他企业	8	企业废水总排放口	
二、废气					
喷漆废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018）中表 1 规定的污染物排放限值和厂界无组织标准要求；厂区内 VOCs 无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中表 A.1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。敏感点恒大小区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）修改单及二级标准要求（详解）。具体标准限值如下表所示。					
表 2-3 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018） 单位：mg/m ³					
序号	污染物项目		适用条件	排放限值	污染物排放监控位置
1	非甲烷总烃	其他	所有	80	车间或生产设施排气筒
表 2-4 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB332146-2018） 单位：mg/m ³					
序号	污染物项目		适用条件	排放限值	
1	非甲烷总烃		所有	4.0	

表 2-5 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

污染物项目	特别排放限值	限值含义	无组织排放监控位置
非甲烷总烃	6	监控点处1h平均浓度值	在厂房外设置监控点

表 2-6 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）（详解）

污染物项目	排放限值	限值含义
非甲烷总烃	2.0mg/m ³	（一次值）

三、噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类类标准。敏感点恒大小区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）二类标准要求。具体标准限值见下表

表 2-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

单位：dB（A）

区域类型	功能区类别	排放限值	
		昼	夜
厂界	3类	65	55

表 2-8 《声环境质量标准》（GB3096-2008）

单位：dB（A）

功能区类别	排放限值	
	昼	夜
二类	60	50

四、固（液）体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定。

表三 工程建设内容

一、项目概况简介

浙江三喜广告装饰有限公司看好广告牌的市场需求，决定租用丽水市云峰海绵制品有限公司部分厂房作为生产车间，厂区位于丽水经济技术开发区枫岭街 8 号，租用建筑面积 907m²。项目采用先进的生产技术或工艺，购置雕刻机、光纤激光切割机、激光焊字机等国产设备。建成年产 5 万米立体字、1 万米展示架的生产能力。

该项目已在丽水经济技术开发区经济发展局登记备案，根据项目登记赋码基本信息表（项目代码：2019-331102-24-03-020000-000），建设单位向环保部门办理环保相关许可手续。

建设单位于 2019 年 8 月委托丽水市环科环保咨询有限公司对该项目编制了《浙江三喜广告装饰有限公司年产 5 万米立体字、1 万米展示架项目环境影响报告表》，并于 2019 年 9 月 10 日取得了丽水市生态环境局出具的《关于浙江三喜广告装饰有限公司年产 5 万米立体字、1 万米展示架项目环境影响报告表的审批意见》（丽环建[2019]81 号）。

项目已取得排污许可登记回执《91331102MA2A11707H001X》，登记日期为 2020 年 6 月 28 日。

根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4 号）以及建设项目竣工环境保护验收管理有关规定。通过对该项目现场调查，收集资料 and 检测，评价该项目的废水、废气、噪声等是否达到国家有关排放标准要求；检查固废产生处置利用情况；核定污染物排放总量是否符合总量控制要求；考核该项目环保设施建设、运行情况及处理效率是否正常；以及环境影响评价要求及环境影响评价批复的落实情况、建设项目环境管理水平。

在研读项目建设及环保等相关资料基础之上，浙江齐鑫环境检测有限公司组织相关技术人员，对项目进行现场勘查和资料收集，在整理收集项目的相关资料后，并依据丽水市生态环境局（丽环建[2019]81 号）文件要求。我公司于 2022 年 3 月派技术人员对其厂及周围环境、生产工艺及污染源产生等情况进行了现场勘查，编制监测方案，并对该项目建设工程所排放的污染物及周边环境进行监测。

项目竣工环境保护验收工作由浙江三喜广告装饰有限公司负责组织，受其委托浙江齐鑫环境检测有限公司承担该项目验收监测和报告编制工作。

二、建设内容

浙江三喜广告装饰有限公司年产5万米立体字、1万米展示架项目位于丽水经济技术开发区枫岭街8号，租用建筑面积907m²。项目采用先进的生产技术或工艺，购置雕刻机、光纤激光切割机、激光焊字机等国产设备。建成年产5万米立体字、1万米展示架的生产能力。项目总投资200万元，环保投资20万元。

项目工作制度及定员：本项目劳动定员8人，实行一班制工作制度，年工作300天。

本次验收为浙江三喜广告装饰有限公司年产5万米立体字、1万米展示架项目的整体验收。验收范围为浙江三喜广告装饰有限公司所在的厂房厂区。

三、地理位置及建筑布局

(1) 项目地理位置及周边概况

本项目位于丽水经济技术开发区枫岭街8号，租用丽水市云峰海绵制品有限公司部分厂房作为生产车间，根据现场调查，项目所在厂界周边情况见下表3-1。

项目地理位置见下图3-1，项目周围环境见下图3-2。

表 3-1 项目周边情况一览表

	方位	概况
项目所在车间 厂界	东侧	园区道路
	南侧	华桑家私
	西侧	丽水市云峰海绵制品有限公司生产厂区
	北侧	丽水市云峰海绵制品有限公司综合楼
	最近敏感点	恒大花园小区（W 170m）

(2) 平面布置

本项目租用丽水市云峰海绵制品有限公司厂区内2#厂房3F，根据建设单位提供的相关资料，各建筑功能见下表3-2。

表 1-7 建筑功能布局一览表

位置	功能
2#厂房3F	生产车间、仓库、生产管理

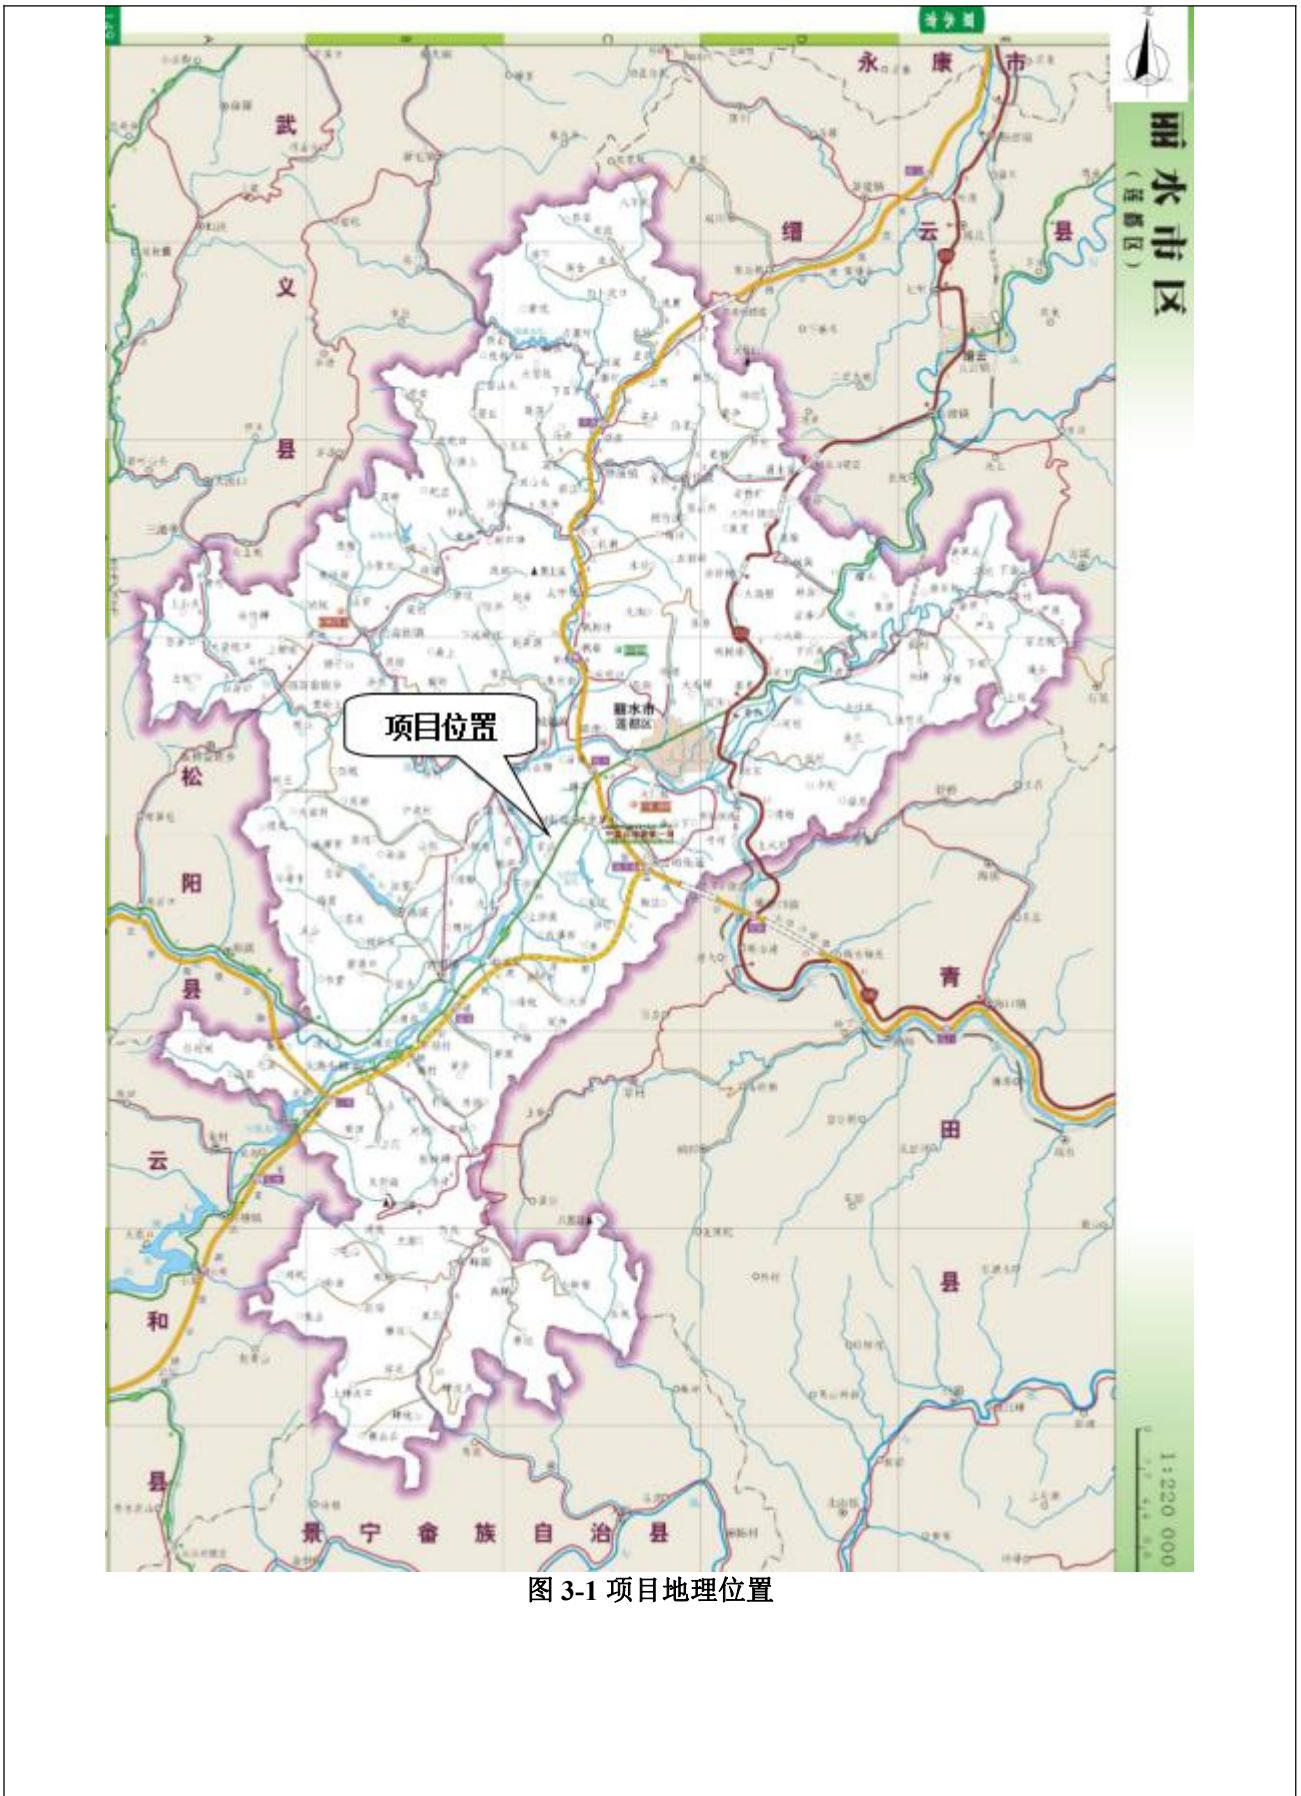


图 3-1 项目地理位置



四、项目主要产品方案

项目相关的产品方案如表 3-3。

表 3-3 项目产品方案一览表

序号	名称	设计生产能力	实际生产能力
1	立体字	5万米/a	5万米/a
2	展示架	1万米/a	1万米/a

项目主要生产设备情况见表 3-4。

表 3-4 项目主要生产设备一览表及说明

环评中建设数量			实际建设数量		备注
序号	设备名称	数量(台套)	设备名称	数量(台套)	
1	雕刻机	1	雕刻机	1	/
2	雕刻机	1	雕刻机	1	/
3	雕刻机	1	雕刻机	1	/
4	光纤激光切割机	1	光纤激光切割机	1	/
5	激光焊字机	2	激光焊字机	2	/
6	弯字机	2	弯字机	2	/
7	激光切割机	1	激光切割机	1	/
8	激光切割机	1	激光切割机	1	/
9	吸塑机	1	吸塑机	1	/
10	UV打印机	1	UV打印机	1	/
11	UV打印机	1	UV打印机	1	/
12	割字机	1	割字机	1	/
13	空压机	2	空压机	2	/
14	水帘喷台	1	水帘喷台	1	湿式

项目主要原辅材料见表 3-5。

表 3-5 项目主要原辅材料消耗一览表

序号	环评设计消耗量		验收阶段消耗量		备注
	名称	消耗量	名称	消耗量	
1	PVC板	1000张/a	PVC板	1000张/a	/
2	亚克力板	1000张/a	亚克力板	1000张/a	/
3	水性漆*	0.2t/a	水性漆	0.1t/a, (5-10kg/桶)	喷漆业务量需求不大, 喷漆用量减少
4	UV油墨*	0.3t/a	UV油墨	0.3t/a, (1-3kg/桶/瓶)	/

本项目所使用的油漆为水性金属漆, 无需调配稀释, 根据建设单位提供的油漆 MSDS 报告, 水性漆中主要溶剂为二丙二醇甲醚(5%); 所用油墨为 UV 油墨, 主要成分为丙烯酸酯树脂(50%), 助剂(20%), 色粉(10%), 光引发剂(10%)。

项目主要能耗情况见表 3-6。

表 3-6 项目主要能耗一览表

序号	原材料名称	环评设计消耗量	验收阶段消耗量	备注
1	水	1710t/a	144t/a	实际水性喷漆需求不大，现状多以uv打印为主，因此喷淋用水量大幅减少
2	电	30万度/a	25万度/a	/

五、用水源及排水

根据建设单位提供的资料，项目营运期间用排水源主要是生活用水和喷淋废水。具体情况见表 3-7。

表 3-7 项目用水及排水情况

序号	名称	用水量/天	规模	天数	年用水量 t/a	排水量 m ³ /a
1	生活用水	50L/人·d	8人	300天	120	96
2	喷淋用水	/			24	循环使用
合计					144	96

六、主要工艺流程及产污环节

6.1 工艺流程

(1) 立体字

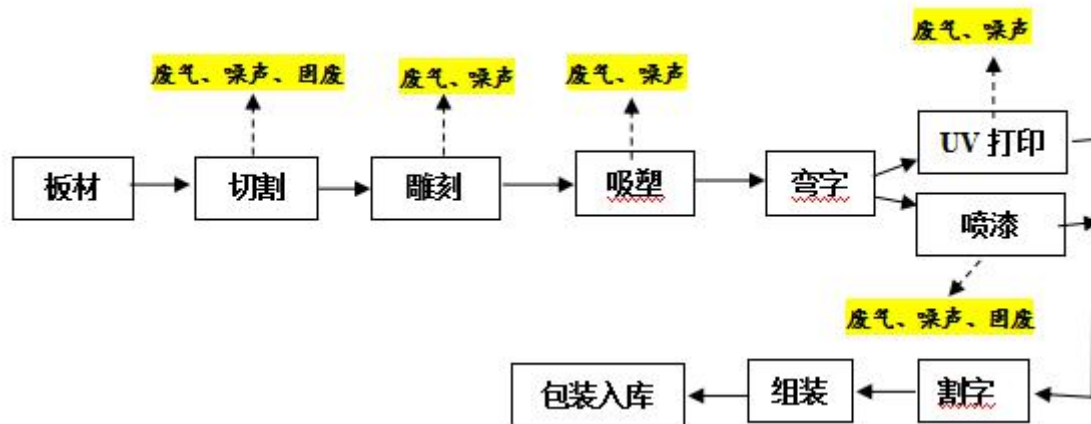


图 3-3 项目工艺流程图

工艺流程简要说明：

- (1) 原料：项目所用原料为外购 PVC 板及亚克力板。
- (2) 切割：利用激光切割机对板材按设计要求进行切割。
- (3) 雕刻：利用雕刻机对板材进行雕刻。
- (4) 吸塑：利用吸塑机对板材进行软化，便于弯字加工，该过程由于仅将塑料板材加热至软化，因此有机废气产生量较少。


(5) UV 打印/喷漆：根据客户需求，对产品进行 UV 打印或喷漆，UV 打印是利用 UV 打印机进行工艺，所用油墨为紫外光固化油墨，为环保型油墨，基本无挥发性有机废气；

喷漆为水性喷漆，为手持喷枪喷漆，喷一道面漆即可，晾干为自然晾干。

(6) 割字：将加工好的立体字进行分割。

组装后成品入库待售。

(2) 展示架

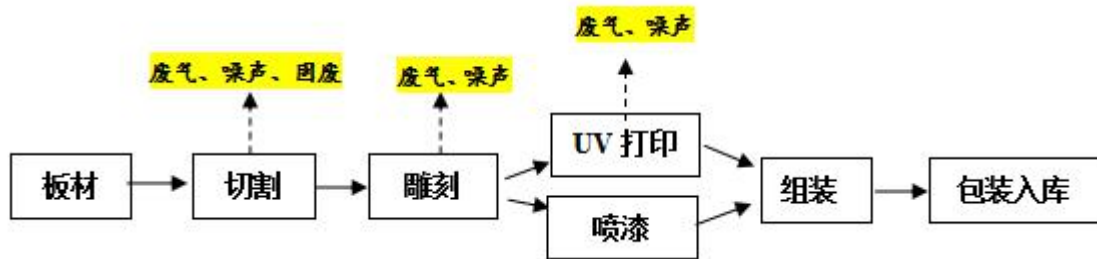

工艺流程简要说明：外购板材经下料切割、雕刻，根据客户需求进行UV打印或水性喷漆，经组装后成品入库待售。

6.2 产污工序

根据工艺流程分析，项目运营过程中产生的污染物主要是废气、废水、噪声和固废，主要污染因子见表 3-8。

表 3-8 项目污染物概况表

污染物编号	污染物名称	产生工序
G1	切割有机废气	激光切割
G2	吸塑有机废气	吸塑
G3	喷漆废气	喷漆
G4	打印废气	UV打印
W1	水帘喷淋水	喷漆
W2	生活废水	职工生活
N	机械噪声	生产过程机械噪声
S1	废板材	切割
S2	水性漆渣	水帘
S3	包装废物	原料拆包
S4	生活垃圾	员工生活
S5	废水性漆桶、废油墨桶	原料使用

七、项目变动情况

项目建设性质、地点、产能、污染治理设施等，基本符合环评及批复要求建设完成。

根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》等文件，本项目建设内容与环评中基本一致，不涉及重大变更。

实际建设建设内容情况见表 3-9。

表 3-9 项目环评与实际建设内容对照表

项目		环评阶段情况	实际验收情况	备注
项目选址		丽水经济技术开发区枫岭街8号	丽水经济技术开发区枫岭街8号	一致
主体工程	经济技术指标	租用面积907m ²	租用面积907m ²	一致
公用工程	给水	项目用水由市政给水管网统一供给。	项目用水由市政给水管网统一供给。	一致
	排水	项目实施雨污分流，废水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求，纳入工业区污水管网，进入水阁污水处理厂处理；水阁污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物综合排放标准》(GB18918-2002)一级A标准	项目实施雨污分流。水帘机水循环使用，长时间使用的废水经沉淀池处理捞渣，上清液后回用生产；生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准要求，纳入工业区污水管网，经水阁污水处理厂统一处理。	一致
	供电	采用园区市政电网供电	采用园区市政电网供电	一致
环保工程	废水处理设施	沿用原厂区化粪池	沿用原厂区化粪池、沉淀池(1m ³)	一致
	废气处理设施	通风换气、废气处理设施	通风换气、废气处理设施(uv光催化)	一致
	噪声治理措施	隔声、减振	合理布局、隔声减振	一致
	一般固废	一般固废外售综合利用或者委托环卫部门清运。	一般固废收集后外售或委托环卫部门清运。	一致
	危险废物	暂存至危废仓库后委托有资质的单位处置	项目危废间位于车间南侧喷漆室旁，面积约8m ² ，房地面落实“三防措施”，标志标识、台账等管理制度已建立。	一致
	环境管理	加强管理，强化员工环保意识，落实环境风险防范制度及措施	项目已基本落实了环境管理制度，定期开展员工环保培训	一致

表四 主要污染源、污染物处理和排放措施

一、废水

1.1 主要污染源

本项目基本实现雨污分流，项目产生的废水主要是生活污水、水帘喷淋废水。

1.2 防治措施及排放

(1) 生活污水

项目职工产生的生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后纳污水管排放，进入水阁污水处理厂处理。

(2) 水帘喷淋废水

本项目设置有水帘机用于去除喷漆漆雾，水帘机喷淋水循环使用不外排，定期的清捞漆渣，根据建设单位提供的相关资料，项目现状多以uv打印为主，水性喷漆工艺作为特别需求使用，因此用水量基本不多。项目设置1台水帘机，循环用水量约为0.05t-0.1t/d（取0.8%），年使用量为24t/a。

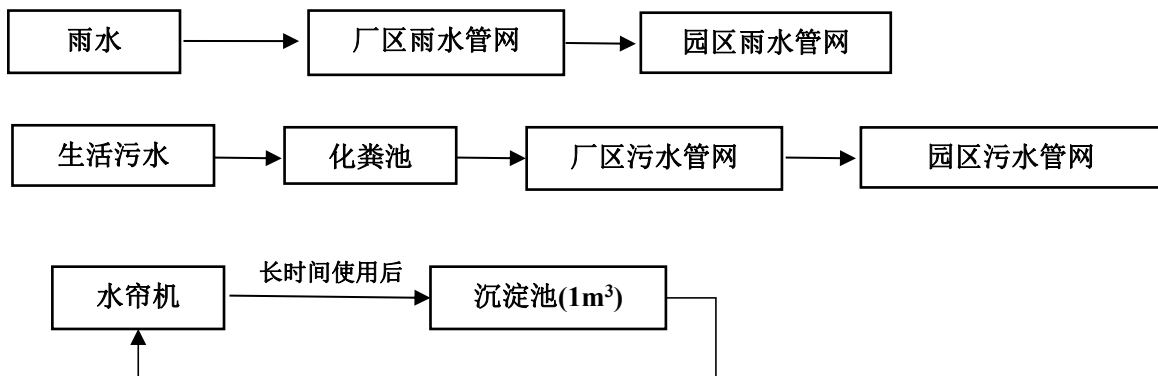


图 4-1 项目废水防治措施

二、废气

2.1 主要污染源

本项目产生的废气主要有切割有机废气、吸塑有机废气、油漆废气及打印废气。

2.2 防治措施及排放

(1) 切割有机废气

激光切割是应用激光聚焦后产生的高能量光束，以瞬间的高温熔化或气化被加工的材料，从而形成切口的一种加工手法。该过程由于塑料板材切口的熔融会产生少量有机废气，企业采取通风换气措施，以无组织形式排放。

(2) 吸塑有机废气

本项目吸塑温度约为90~100摄氏度左右，使塑料软化即可，未达到塑料分解温度(270℃

以上），废气产生量较小，以无组织形式排放。

（3）油漆废气

项目喷漆为一道面漆，喷漆台设置在单独隔间内，无需调漆，采用自然晾干，晾干在房间内进行，喷漆房除进出门及必要工作需求开口之外无其他开口，喷漆时门处于关闭状态，通过水帘送风机和抽风机进行换气，废气最终引至 uv 光催化设施处理后高空排放。

（4）打印废气

项目采用 UV 打印的工艺，所用油墨为紫外光固化油墨，有机废气产生量不大，企业采取通风换气措施，以无组织形式排放。

三、噪声

本项目噪声主要来源为设备运行时所产生的机械噪声。企业已按环评要求落实了以下噪声防治措施：

（1）选购高效、低噪设备并加强设备日常检修和维护；（2）车间内生产设备合理布局；（3）提倡文明生产，提高员工的环保意识，减少不必要的噪声污染。

四、固体废物

项目营运期间产生的固体废物主要为废板材、水性漆渣、包装废物、生活垃圾和废包装桶。

（1）废板材：主要为激光切割过程产生的废塑料板材，外售综合利用。

（2）水性漆渣：主要来自水帘喷漆机和废水沉淀捞渣产生的水性漆渣，由于项目水性喷漆工艺使用频次较少，产生的少量漆渣现状收集暂存危废间内，远期达到处置量后再委托有资质的危废单位处置。

（3）包装废物：主要为原料拆包过程产生的塑料、纸屑，收集后委托环卫部门清运处置。

（4）生活垃圾：收集后委托环卫部门清运处置。

（5）废包装桶：包含水性漆桶和水性油墨，产生的少量空桶现状收集暂存危废间内，远期达到处置量后再委托有资质的危废单位处置。

表 4-1 项目固体废物情况一览表

序号	固体废物名称	产生工序	形态	属性	危废代码	实际产生量	处置措施
1	废板材	生产加工	固态	一般固废	/	40t/a	外售废品回收单位
2	包装废物	原料拆包	固态	一般固废	/	2t/a	委托环卫部门 清运
3	生活垃圾	职工生活	固态	一般固废	/	0.2t/a	
4	水性漆渣	水帘机废水	固态	危险废物	900-252-12	0.02t/a	现状收集暂存

		沉淀处理					危废间，远期委托有资质单位处置
5	废包装桶	原料使用	固态	危险废物	900-041-49	0.07t/a	

项目危废间位于车间南侧喷漆室旁，面积约 8m²，企业已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，对危废间落实“三防”措施，张贴标志标识，建立相关的危废台账，安排专人负责运行管理。

五、其他环境保护设施

5.1 环境风险防范设施

建设单位已基本落实环境风险防范措施，并做出如下措施：（1）加强安全管理，对职工进行安全生产培训、生产技能培训和风险防范、应急培训，确保生产职工掌握一定的安全生产技能和风险应急技能；（2）各类建筑内配备灭火器、消火栓等设施，同时定期对上述设备进行检查，确保消防设施处于正常状况下；（3）加强车间内通风换气，保持空气流通顺畅；（4）制定了基本的应急措施和应急制度，并配备相应的员工劳保用品。

5.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

本项目无监测设施，无在线监测装置。

六、环境管理检查结果

6.1 环保管理制度及人员责任分工

为加强环保管理，公司已配专人负责环保管理及环保设施运行操作，负责对废水、废气、固废等环保设施的运行操作以及做好台帐记录，以保证环保设备的正常运转。

6.2 监测手段及人员配置

建设单位无监测手段和监测人员，委托验收单位进行监测分析。

七、环保设施投资及“三同时”落实情况

工程环评报告表阶段：项目总投资 200 万元，其中环保投资 26 万元，占本项目投资总额 13%。

根据建设方提供，项目营运期总投资 200 万元，其中环保投资 20 万元，占本项目投资总额 10%。

表 4-2 实际环保投资情况一览表

序号	项目	内容	环评预估投资（万元）	验收实际投资（万元）	备注
1	废水	利用厂区已有化粪池、絮凝沉淀池	1	0.5	已落实
2	废气	废气处理设施、排气筒、通风设备	20	13	
3	噪声	隔声降噪	3	4	
4	固体废物	固废处置	2	2.5	
合计			26	20	

由上表可知，企业在废水防治、废气收集治理、噪声防治、固废收集等环境保护工作上投入一定资金，确保了环境污染防治工程措施到位，基本落实环保“三同时”要求。

表五 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

一、环境影响报告表主要结论

表 5-1 项目环评污染防治措施落实情况一览表

内容类型	产污环节	环评防治措施	实际防治措施	对比要求
大气污染物	喷漆废气	油漆废气引至低温等离子设备处理后至15m高空排放	项目设置了封闭的喷漆间，喷漆、自然晾干均在房内进行，喷漆时漆雾经水帘机处理，废气经风机引至uv光催化设施处理后，15m排气筒排放	满足
	激光切割废气	加强车间通风	加强车间通风换气	满足
	uv打印废气			
	吸塑废气			
水污染物	生活污水	生活废水经化粪池处理后纳入市政污水管网，进入水阁污水处理厂处理	生活废水经厂区的化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，纳入园区污水管网，进入水阁污水厂处理	满足
	水帘喷淋废水	经絮凝沉淀后循环使用不外排	经絮凝沉淀后循环使用不外排	满足
固体废物	废板材	外售综合利用	外售综合利用	满足
	水性漆渣	暂存至危险废物仓库后委托有资质的单位处置	现状产生量较少收集暂存危废间内，远期委托有资质单位处置	
	包装废物	分类收集，委托环卫部门清运、处置	分类收集，委托环卫部门清运、处置	
	生活垃圾			
废包装桶	暂存至危险废物仓库后委托有资质的单位处置	现状产生量较少收集暂存危废间内，远期委托有资质单位处置		
噪声	机械噪声	合理布局；合理选型，选用低噪声设备；对于高噪声设备设置减振基础和安装消声器；加强管理，降低人为噪声。	合理布局；合理选型，按照环评提出的噪声防护措施后，厂界噪声均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中规定的3类标准要求。	满足

二、审批部门的决定：

丽水市生态环境局《关于浙江三喜广告装饰有限公司年产5 万米立体字、1 万米展示架项目环境影响报告表的审批意见》（丽环建[2019]81 号）

浙江三喜广告装饰有限公司：

你单位报送的《浙江三喜广告装饰有限公司年产5 万米立体字、1 万米展示架项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料已悉。经我局审查，提出如下环境保护审查意见：

一、原则同意该项目环评报告的相关结论（项目将于丽水经济技术开发区枫岭街8 号实施），详细位置见项目地理位置图。期间若项目性质、规模、地点或采用的生产工艺发生改变的，应当重新报我局审批。

二、该项目总投资 200 万元，建筑面积 907 平方米。项目实行一班制生产，全年生产日为 300 天。

三、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，落实各项污染防治措施：

1、厂区实行雨污分流，只设一个污水排放口。生产车间内产生的各类废水必须进行分质、分流处理，工艺废水管线采用架空敷设，并采取相应措施预防因地面沉降而引起的废水外溢或渗漏事故，生活废水须经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和相应标准要求（如 COD_{Cr}<500mg/L、BOD₅<300mg/L、石油类<20mg/L、PH: 6-9、NH₃-N<35mg/L）后，纳入工业园区污水管网，由水阁污水处理厂处理达标后统一排放。外排废水必须设置规范的监视监测采样井。

2、合理布局高噪声源、妥善安排工作时段，并采取有效的隔音、降噪、减振措施，确保厂区厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的厂界外声环境 3 类功能区标准要求，即昼间≤65 分贝，夜间≤55 分贝。

3、加强生产过程的管理，采用先进设备，采取措施，减少各类废气的排放。项目喷漆产生的废气须经集中收集处理，达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表 1 的排放限值，如相关污染物排放限值和排气筒高度要求为：总挥发性有机物《150mg/m³，非甲烷总烃《80mg/m³，高空排放的排气筒高度>15 米。要确保废气污染物排放达到总量控制和减排的有关要求，并采取措施，提高各类废气的收集率，减少无组织排放，确保未被收集的各类工艺废气无组织排放周界外浓度最高点达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表 6 相应标准要求，如非甲烷总烃厂界无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点≤4.0mg/m³。

4、企业必须积极推行清洁生产，减少固体废物的产生量，生产工艺中产生的固废应尽量回收利用；水性漆渣属于危险废物，必须按国家《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求设置相对独立、封闭、防渗漏的危险废物贮存场所，妥善和规范贮存、转移、处置（须送有处置资质和能力的危险废物处置单位）危险废物；废板材、包装废物等普通固废必须按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）妥善收集、贮存，不得露天随意堆放，尽量综合利用；生活垃圾及时清运，纳入城市垃圾处理系统统一处理。

四、以上批复意见和环境影响评价报告提出的建议、措施及你公司所做出的各项承诺，必须在项目建设及运营过程中切实加以落实。根据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定，项目配套的环保设施须验收合格后，该项目才能正式投入生产。该项目审批后的日常环境监督管理工作由丽水经济技术开发区生态环境保护综合行政执法队负责。

表 5-2 环评批复、验收情况一览表

分类	环评及批复要求	验收情况	备注
废水	厂区实行雨污分流，只设一个污水排放口。生产车间内产生的各类废水必须进行分质、分流处理，工艺废水管线采用架空敷设，并采取相应措施预防因地面沉降而引起的废水外溢或渗漏事故，生活废水须经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和相应标准要求（如C0Dcr<500mg/L、B0D5<300mg/L、石油类<20mg/L、PH: 6-9、NH3-N<35mg/L）后，纳入工业园区污水管网，由水阁污水处理厂处理达标后统一排放。外排废水必须设置规范的监视监测采样井	本项目厂区实行雨污分流制；喷淋废水循环使用不外排，定期添加损耗水；生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，纳入市政污水管网，进入水阁污水处理厂处理。	符合
废气	加强生产过程的管理，采用先进设备，采取措施，减少各类废气的排放。项目喷漆产生的废气须经集中收集处理，达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表1的排放限值，如相关污染物排放限值和排气筒高度要求为：总挥发性有机物《150mg/m3，非甲烷总烃《80mg/m3，高空排放的排气筒高度>15米。要确保废气污染物排放达到总量控制和减排的有关要求，并采取措施，提高各类废气的收集率，减少无组织排放，确保未被收集的各类工艺废气无组织排放周界外浓度最高点达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表6相应标准要求，如非甲烷总烃厂界无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点≤4.0mg/m3。	根据现场调查及验收监测数据，项目基本落实了环评中提出的各类防治措施，且污染物排放符合相应的排放标准要求。防治措施详见表5-1，监测数据详见文本表八验收监测结果单元。	符合
噪声	合理布局高噪声源、妥善安排工作时段，并采取有效的隔音、降噪、减振措施，确保厂区厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)规定的厂界外声环境3类功能区标准要求，即昼间≤65分贝，夜间≤55分贝。	本项目采取环评提出的噪声防止措施后，厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类、4类标准要求。敏感点符合《声环境质量标准》(GB3095-2008)二类标准要求	符合
固废	企业必须积极推行清洁生产，减少固体废物的产生量，生产工艺中产生的固废应尽量回收利用；水性漆渣属于危险废物，必须按国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求设置相对独立、封闭、防渗漏的危险废物贮存场所，妥善和规范贮存、转移、处置（须送有处置资质和能力的危险废物处置单位）危险废物；废板材、包装废物等普通固废必须按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)妥善收集、贮存，不得露天随意堆放，尽量综合利用；生活垃圾及时清运，纳入城市垃圾处理系统统一处理	项目产生的废板材外售综合利用；包装废物、生活垃圾委托环卫部门清运。项目一般固废处理处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)标准要求；项目产生的少量水性漆渣、废包装桶贮存于车间南侧喷漆室旁，并按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)落实了相关的防治措施，后续委托有资质单位处置。	符合

表六 验收监测质量保证及质量控制

一、监测分析方法

表 6-1 监测分析方法一览表

类别	检测项目	检测方法
废水	pH值	水质 PH值的测定 电极法HJ/1147-2020
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法HJ 828-2017
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989
	BOD5	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外光度法 HJ 637-2018
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/11893-19
无组织 废气	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995
有组织 废气	非甲烷总烃	固定污染源排气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017
噪声	企业厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008

二、监测分析仪器

表 6-2 监测分析仪器一览表

序号	仪器名称/型号	仪器编号	校准证书编号
1	多功能声级计AWA6228	S-X-049	1A1702439-0007
2	全自动大气/颗粒物综合采样器MH1200	S-X-038	HX21-01308-7
3	全自动大气/颗粒物综合采样器MH1200	S-X-039	HX21-01308-6
4	全自动烟尘气测试仪 (流速)	S-X-028	ZHJL-2021096035
5	可见分光光度计	S-L-007	CAB2017070002
6	便携式PH计	S-X-048	CAA2020050008
7	鼓风干燥箱	S-L-009-2	T/AE2017070001
8	标准COD消解器	S-L-013-1	/
9	紫外可见分光光度计	S-L-018	CAD2020070002
10	分析电子天平	S-L-019	FAD2020070027
11	气相色谱仪	S-L-013-1	CBA2020070001

三、水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次验收监测中水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》(第四版)的要求进行。采样过程中已采集一定比例的平行样；实验室分析过程相关情况见表 6-3。

表 6-3 水质质控数据分析表

现场平行结果评价				
分析项目	样品浓度 (mg/L)	平行样 相对偏差%	允许 相对偏差%	结果评价
pH	7.6	/	/	/
	7.6			
化学需氧量	311	0.8	≤10	合格
	309			
氨氮	28.3	1.1	≤10	合格
	29.9			
加标回收率结果评价				
分析项目	加标回收率%		允许加标回收 率%	结果评价
氨氮	101.0		95-105	合格
现场空白结果评价				
分析项目	浓度 (mg/L)	检出限 (mg/L)	结果评价	
氨氮	<0.025	0.025	合格	
化学需氧量	<4	4	合格	
质控样结果评价				
分析项目	质控样编号	样品浓度 (mg/L)	定值 (mg/L)	结果评价
氨氮	GSB07-3164-2014/2005263	0.717	0.705±0.045	合格

四、噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

声级计在监测前后用标准发声源进行校准，附噪声仪器校验表。

表 6-4 噪声仪器准确度校准

声级计编号	声校准器定值	测量器定值	测量后定值	允许差值	校准结果判定
S-X-049	94.0dB(A)	93.8dB(A)	93.8dB(A)	± 0.5dB(A)	符合要求

五、人员能力

参加本次验收监测的人员均通过相关单位考核，持证上岗，相关检测能力已具备。

六、气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测人员持证上岗；监测前对使用的仪器均进行了流量和浓度校正，采样和分析过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）和《空气和废气监测分析方法》进行。

表七 验收监测内容

一、废水

表 7-1 废水监测内容一览表

类别	监测点位	监测因子	监测频次	监测周期
生活废水	厂区总排口 FS1#	pH值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、总磷	4次/天	2天

二、废气

表 7-2 无组织废气监测内容一览表

类别	监测点位	监测因子	监测频次	监测周期
无组织废气	厂界上风向WQ1#	非甲烷总烃	4次/天	2天
	厂界下风向WQ2#	非甲烷总烃		
	喷漆车间WQ3#	非甲烷总烃		
环境空气	恒大小区WQ4#	非甲烷总烃	4次/天	2天

表 7-3 有组织废气监测内容一览表

类别	监测点位	监测因子	监测频次	监测周期
有组织废气	喷漆废气排气筒 出口YQ1#	非甲烷总烃	3次/天	2天

三、噪声

表 7-4 噪声监测内容一览表

类别	监测点位	监测因子	监测频次	监测周期
厂界噪声	厂界东侧ZS1#	LAeq	昼间1次/ 天	2天
	厂界南侧ZS2#			
	厂界西侧ZS3#			
	厂界北侧ZS4#			
声环境	恒大小区ZS5#	LAeq	昼间1次/ 天	2天

四、固（液）体废物

表 7-5 固废调查内容一览表

类别	属性	调查内容
固废	一般固废	项目一般固废产生处置利用情况
	危险废物	项目危险废物产生处置利用情况

五、验收期间监测点位布局

验收期间监测点位布局见下图：

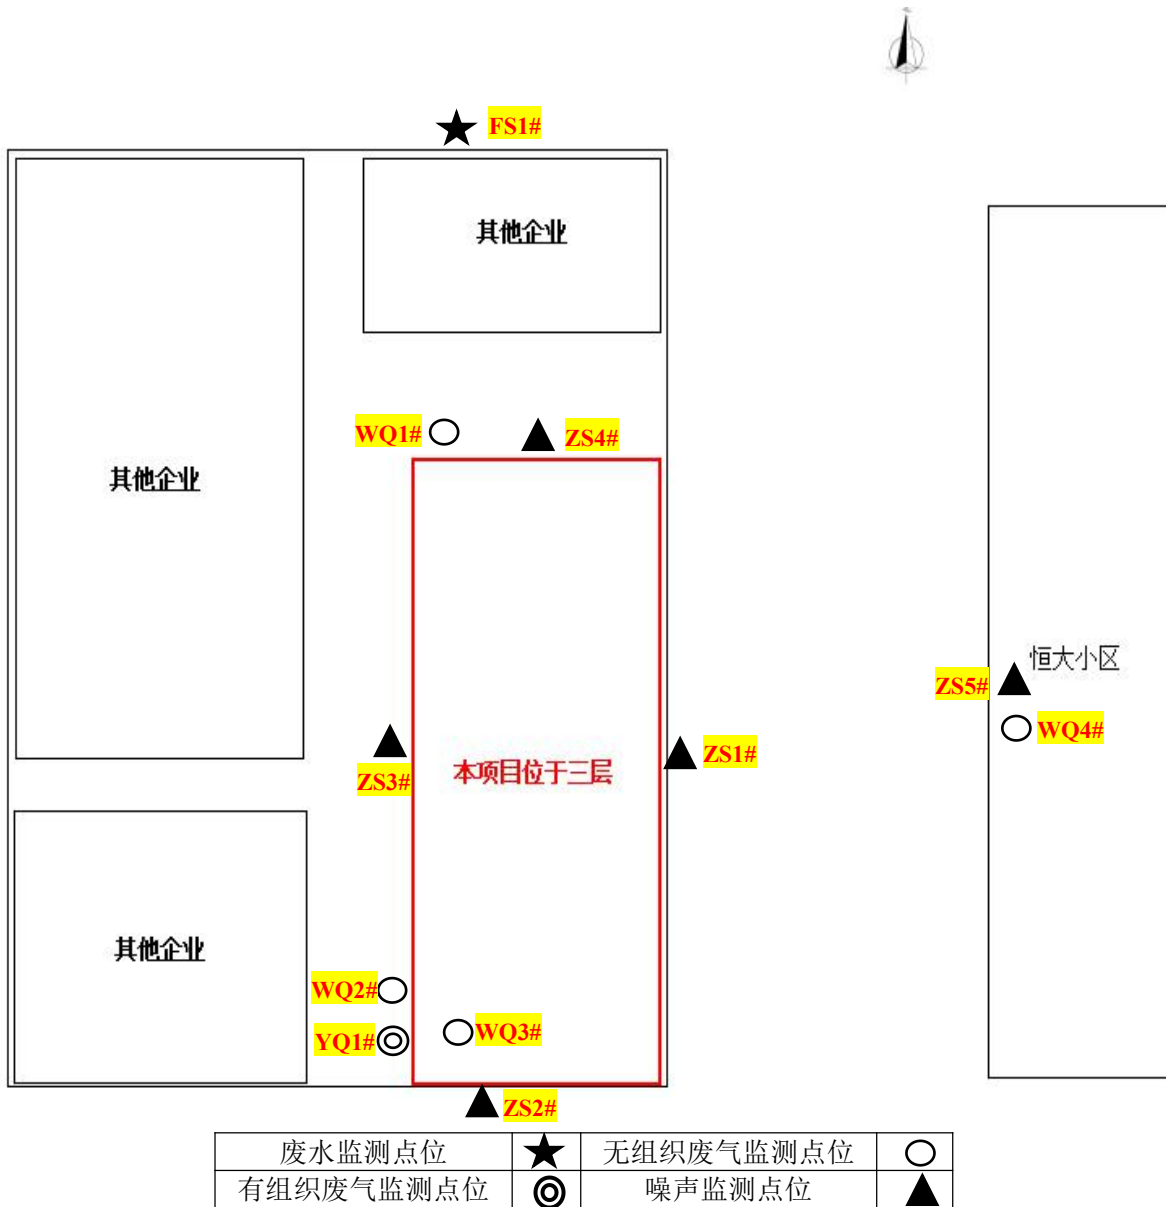


图 7-1 项目监测点位示意图

表八 验收监测结果

一、验收期间工况记录:

浙江三喜广告装饰有限公司年产5万米立体字、1万米展示架项目污染防治设施验收监测日期为2022年4月15日~16日,根据《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》的有关规定和要求,验收监测时应因保证工况稳定、生产设施和环保设施正常运行。通过对现场生产状况的调查以及公司提供的资料显示,项目验收期间工况报表见表8-1、表8-2。

表8-1 监测工况表

日期	环评设计产能/年	验收实际产能/年	监测期间实际情况/天
4月15日	5万米字、1万米展示架	5万米字、1万米展示架	155m字、30米展示架
4月16日			155m字、30米展示架

表8-2 监测期间运行工况及能耗记录表

序号	日期	名称	验收详情
1	4月15日	水	0.48t/d
2		电	831度/d
3		原材料	Pvc板3张/d、亚克力板3张/d、水性漆0.001t/d、水性油墨0.001t/d
4		主要生产设备	水帘喷台、雕刻机、切割机、吸塑机、UV打印机等
5		污染防治措施	有机废气处理设施、通风换气措施等
6	4月16日	水	0.45t/d
7		电	828度/d
8		原材料	Pvc板3张、亚克力板3张、水性漆0.001t/d、水性油墨0.001t/d
9		主要生产设备	水帘喷台、雕刻机、切割机、吸塑机、UV打印机等
10		污染防治措施	有机废气处理设施、通风换气措施等

表8-3 气象参数

采样点位	日期	风向	风速 (m/s)	气温 (°C)	气压 (kPa)	天气状况
厂界上风向	4月15日	北	1.2	17.3	101.5	晴
	4月16日	北	1.2	16.2	101.6	晴
厂界下风向	4月15日	北	1.3	16.8	101.5	晴
	4月16日	北	1.2	16.4	101.6	晴
喷漆车间	4月15日	北	1.2	19.2	101.2	晴
	4月16日	北	1.3	17.2	101.5	晴
恒大小区	4月15日	北	1.2	17.7	101.4	晴
	4月16日	北	1.3	16.0	101.6	晴

二、项目污染物监测结果:

2.1、废水监测结果

2022年4月15日~16日对项目所排放的废水污染物进行了连续2天监测,废水监测结果及达标情况见如下表所示。

表 8-4 废水监测结果

单位: mg/L (除 pH 外)

采样点	检测项目	检测结果								排放标准	达标与否
		4月15日				4月16日					
		第1次	第2次	第3次	第4次	第1次	第2次	第3次	第4次		
厂区总排口 FS1#	样品性状	微黄 微浑	微黄 微浑	微黄 微浑	微黄 微浑	微黄 微浑	微黄 微浑	微黄 微浑	微黄 微浑		
	pH值	7.6	7.7	7.5	7.6	7.7	7.8	7.7	7.6	6-9	达标
	化学需氧量	303	306	315	302	310	298	308	311	500	达标
	五日生化需氧量	87.9	85.3	85.9	88.9	88.6	89.3	86.9	87.4	300	达标
	氨氮	28.7	26.8	27.4	25.5	29.2	27.6	26.0	28.2	35	达标
	悬浮物	21	25	23	22	19	28	24	23	400	达标
	石油类	1.26	1.11	1.43	1.46	1.49	1.16	1.03	1.18	20	达标
	总磷	0.094	0.059	0.086	0.102	0.086	0.098	0.067	0.078	8	达标

监测结果表明:

验收监测期间,本项目总排口废水中pH值范围、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准;其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)要求。

2.2、废气监测结果

2.2.1 无组织排放

2022年4月15日~16日对项目无组织废气污染物排放进行了连续2天监测，具体无组织废气监测结果见下表所示，气象参数见表8-3。

表8-5 无组织废气监测结果

单位：mg/m³

厂界检测结果			
采样点位	检测日期	采样频次	检测指标
			非甲烷总烃
厂界上风向WQ1#	4月15日	第一次	0.94
		第二次	0.93
		第三次	0.93
		第四次	0.98
	4月16日	第一次	0.94
		第二次	0.92
		第三次	0.93
		第四次	0.86
厂界下风向WQ2#	4月15日	第一次	2.19
		第二次	2.31
		第三次	2.11
		第四次	2.09
	4月16日	第一次	2.06
		第二次	2.05
		第三次	1.91
		第四次	1.97
排放标准			4.0
达标与否			达标

监测结果表明：

验收监测期间，项目厂界非甲烷总烃浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）标准要求。

表 8-6 无组织废气监测结果

单位: mg/m³

厂区内无组织检测结果			
采样点位	检测日期	采样次数	检测指标
			非甲烷总烃
喷漆车间内WQ3#	4月15日	第一次	0.83
		第二次	0.75
		第三次	0.70
		第四次	0.65
	4月16日	第一次	0.58
		第二次	0.56
		第三次	0.53
		第四次	0.50
排放标准			6 (监控点1h浓度均值)
达标与否			达标

监测结果表明:

验收监测期间,项目喷漆车间非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)标准要求。

表 8-7 无组织废气监测结果

单位: mg/m³

敏感点检测结果			
采样点位	检测日期	采样次数	检测指标
			非甲烷总烃
恒大小区WQ4#	4月15日	第一次	0.28
		第二次	0.25
		第三次	0.27
		第四次	0.23
	4月16日	第一次	0.27
		第二次	0.23
		第三次	0.24
		第四次	0.27
排放标准			2.0 (一次值)
达标与否			达标

监测结果表明:

验收监测期间,恒大小区非甲烷总烃浓度符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)详解标准要求。

2.2.2 有组织排放

2022年4月15日~16日对项目有组织废气污染物排放进行了连续2天监测，具体有组织废气监测结果见下表8-8。

表8-8 有组织废气监测结果

单位: mg/m³

废气检测结果			
采样点位	检测日期	采样次数	检测指标
			非甲烷总烃
喷漆废气排气筒出口 YQ1#	4月15日	第一次	2.98
		第二次	2.85
		第三次	2.66
	4月16日	第一次	2.95
		第二次	2.74
		第三次	2.60
均值			2.80
标杆流量 (m ³ /h)			2306
排放速率 (kg/h)			0.006
排放标准			80
达标与否			达标

监测结果表明:

验收监测期间，项目喷漆废气排气筒出口非甲烷总烃排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)标准要求。

2.3、噪声监测结果

2022年4月15日~16日对项目厂界噪声进行了连续2天监测，噪声监测结果及达标情况见表8-9。

表8-9 噪声监测结果

单位: dB(A)

监测时间	序号	测点名称	昼间噪声级dB(A)	排放标准dB(A)	达标与否
4月15日	ZS1#	厂界东侧	60.7	昼间≤65	达标
	ZS2#	厂界南侧	59.3	昼间≤65	
	ZS3#	厂界西侧	61.4	昼间≤65	
	ZS4#	厂界北侧	60.9	昼间≤65	
	ZS5#	恒大小区	57.7	昼间≤60	
4月16日	ZS1#	厂界东侧	60.2	昼间≤65	达标
	ZS2#	厂界南侧	58.5	昼间≤65	

	ZS3#	厂界西侧	61.6	昼间≤65
	ZS4#	厂界北侧	62.4	昼间≤65
	ZS5#	恒大小区	58.4	昼间≤60

监测结果表明：

验收监测期间，项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；恒大小区敏感点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）二类标准要求。

2.4、固（液）体废物监测调查结果

根据现场调查，项目营运期间产生的固废废物处理处置措施如下：

项目产生的危险废物贮存于车间南侧的喷漆间旁，面积约8m²，企业已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB1859-2001）标准要求，对危废间落实了相关的防治措施（主要包括“三防措施”、张贴标志标识、建立危废台账等管理制度）。

2.5、污染物排放总量核算

根据《重点区域大气污染防治“十二五”规划》（环发[2012]130号），“十二五”期间纳入排放总量控制的污染物为COD、SO₂、NH₃-N、氮氧化物、工业烟粉尘、VOCs。

项目厂区不排放生产废水且排放的水主要源自厂区内独立生活区域所排放生活污水的，其新增的化学需氧量和氨氮两项水主要污染物排放量可不进行区域替代削减。

根据环评文件，项目纳入总量控制的指标为VOCs：0.0041t/a。

根据验收期间监测结果核算，项目VOCs排放量为：0.0039 t/a，符合总量控制要求。

表 8-10 污染物排放总量核算一览表

名称	类别	排放速率 (kg/h)	工作 时间 (h/a)	实际排 放量 (t/a)	总量 (t/a)	增减量 (t/a)	是否符合总 量控制要求
废气	VOCs	0.006	600	0.0039	0.0041	-0.0002	是

表九 验收监测结论

一、废水监测结论

本项目总排口废水中 pH 值范围、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、石油类排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，其中氨氮、总磷符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。

二、废气监测结论

无组织排放：项目厂界非甲烷总烃浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）厂界标准要求。项目喷漆车间非甲烷总烃浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）标准要求。

恒大小区非甲烷总烃浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）详解标准要求。

有组织排放：项目喷漆废气排气筒出口非甲烷总烃排放浓度符合《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）标准要求。

三、噪声监测结论

项目厂界东侧、南侧、西侧、北侧昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准要求；恒大小区敏感点符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）二类标准要求。

四、固（液）体废物监测结论

项目一般固废处理处置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）的要求。

项目危险废物处理处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB1859-2001）标准要求。

五、总量控制

根据总量核算，本项目实际总量控制指标符合排放总量值，因此本项目符合总量控制。

六、总结论

浙江三喜广告装饰有限公司年产5万米立体字、1万米展示架项目在实施过程和试运行中，按照建设项目环境保护“三同时”的相关要求，根据现场勘查及两天检测数据分析结果，基本落实了环评报告中要求的相关内容，验收监测结果表明各污染物排放指标均符合相应标准，基本具备建设项目环保设施竣工验收条件，建议通过建设项目竣工环保验收。

七、其他需要说明的事项和建议要求

（1）其他说明事项

本项目生活污水处理设施沿用原厂已建设施；喷漆有机废气污染物已按照环评要求建

设了废气处理设施进行处理，根据监测结果均符合排放标准要求。

验收过程简况详见报告 P5 页，项目均已落实相关手续并取得主管部门的审批，基本落实环保“三同时验收”相关要求。

其他环保措施主要有通过对员工培训，强化员工的环保意识，开展文明生产，以及加强生产设备的的维修与保养，并建立运行台账，确保设备正常运行。

(2) 建议与要求

建立健全的环保规章制度，有条件时可设定环保专员管理企业环保工作，并及时反馈工作情况。

建议企业每年定期开展自行监测，确保项目厂区内污染物达标排放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：

填表人（签字）：

项目经办人（签字）：

建设项目	项目名称	年产5万米立体字、1万米展示架项目					项目代码	/	建设地点	丽水经济技术开发区枫岭街8号				
	行业类别（分类管理名录）	C243工艺美术及礼仪用品制造					建设性质	新建		项目厂区中心经度/纬度	/			
	设计年产情况	5万米立体字、1万米展示架					验收年产情况	5万米立体字、1万米展示架		环评单位	丽水市环科环保咨询有限公司			
	环评文件审批机关	丽水市生态环境局					审批文号	丽环建[2019]81号	环评文件类型	环境影响报告表				
	开工日期	2019年10月					竣工日期	2021年5月	排污许可证申领时间	2020年6月28日				
	环保设施设计单位	/					环保设施施工单位	/	本工程排污许可证编号	91331102MA2A1L707H001X				
	验收单位	浙江齐鑫环境检测有限公司					环保设施监测单位	浙江齐鑫环境检测有限公司						
	投资总概算（万元）	200					环保投资总概算（万元）	26	所占比例（%）	13				
	实际总投资（万元）	200					实际环保投资（万元）	20	所占比例（%）	10				
	废水治理（万元）	0.5	废气治理（万元）	13	噪声治理（万元）	4	固体废物治理（万元）	2.5	绿化及生态（万元）	/	其他（万元）	/		
新增废水处理设施能力	/					新增废气处理设施能力	/	年平均工作时间	300天					
建设单位	浙江三喜广告装饰有限公司			运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码）			91331102MA2A1L707H		验收监测时间	2022年4月15日-16日				
污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填）	污染物	原有排放量(1)	本期工程实际排放浓度(2)	本期工程允许排放浓度(3)	本期工程产生量(4)	本期工程自身削减量(5)	本期工程实际排放量(6)	本期工程核定排放总量(7)	本期工程“以新带老”削减量(8)	全厂实际排放总量(9)	全厂核定排放总量(10)	区域平衡替代削减量(11)	排放增减量(12)	
	废水													
	化学需氧量													
	氨氮													
	二氧化硫													
	氮氧化物													
	烟（粉）尘													
	VOCs						0.0039					0.0041	-0.0002	
与项目有关的其他特征污染物														

附件一：项目环评批复

丽水市生态环境局文件

丽环建〔2019〕81号

关于浙江三喜广告装饰有限公司年产5万米立体字、1万米展示架项目环境影响报告表的 审查意见

浙江三喜广告装饰有限公司：

你单位报送的《浙江三喜广告装饰有限公司年产5万米立体字、1万米展示架项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）等有关材料已悉。经我局审查，提出如下环境保护审查意见：

一、原则同意该项目环评报告的相关结论（项目将于丽水经济技术开发区枫岭街8号实施），详细位置见项目地理位置图。期间若项目性质、规模、地点或采用的生产工艺发生改变的，应当重新报我局审批。

二、该项目总投资200万元，建筑面积907平方米。项目实

— 1 —

行一班制生产，全年生产日为300天。

三、严格执行建设项目环境保护“三同时”制度，落实各项污染防治措施：

1、厂区实行雨污分流，只设一个污水排放口。生产车间内产生的各类废水必须进行分质、分流处理，工艺废水管线采用架空敷设，并采取相应措施预防因地面沉降而引起的废水外溢或渗漏事故，生活废水须经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和相应标准要求（如COD_{Cr} ≤ 500mg/L、BOD₅ ≤ 300mg/L、石油类 ≤ 20mg/L、PH: 6-9、NH₃-N ≤ 35mg/L）后，纳入工业园区污水管网，由水阁污水处理厂处理达标后统一排放。外排废水必须设置规范的监视监测采样井。

2、合理布局高噪声源、妥善安排工作时段，并采取有效的隔音、降噪、减振措施，确保厂区厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的厂界外声环境3类功能区标准要求，即昼间 ≤ 65分贝，夜间 ≤ 55分贝。

3、加强生产过程的管理，采用先进设备，采取措施，减少各类废气的排放。项目喷漆产生的废气须经集中收集处理，达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）中表1的排放限值，如相关污染物排放限值和排气筒高度要求为：总挥发性有机物 ≤ 150 mg/m³，非甲烷总烃 ≤ 80 mg/m³，高空排放的排气筒高度 ≥ 15米。要确保废气污染物排放达到总量控制和减排的有关要求，并采取措施，提高各类废气的收集率，减少无组织排

放，确保未被收集的各类工艺废气无组织排放周界外浓度最高点达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)中表6相应标准要求，如非甲烷总烃厂界无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点 $<4.0\text{ mg}/\text{m}^3$ 。

4、企业必须积极推行清洁生产，减少固体废物的产生量，生产工艺中产生的固废应尽量回收利用；水性漆渣属于危险废物，必须按国家《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求设置相对独立、封闭，防渗漏的危险废物贮存场所，妥善和规范贮存、转移、处置(须送有处置资质和能力的危险废物处置单位)危险废物；废板材、包装废物等普通固废必须按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)妥善收集、贮存，不得露天随意堆放，尽量综合利用；生活垃圾及时清运，纳入城市垃圾处理系统统一处理。

四、以上批复意见和环境影响评价报告提出的建议、措施及你公司所做出的各项承诺，必须在项目建设及运营过程中切实加以落实。根据《建设项目环境保护管理条例》第二十三条的规定，项目配套的环保设施须验收合格后，该项目才能正式投入生产。

该项目审批后的日常环境监督管理工作由丽水经济技术开发区生态环境保护综合行政执法队负责。



(此页无正文)

抄送：市环境监测中心站，丽水经济技术开发区生态环境保护综合行政执法队，开发区经发局、建设局、规划分局、国土分局。

丽水市生态环境局办公室

2019年9月10日印发

— 4 —

附件二：排污许可登记

固定污染源排污登记回执

登记编号：91331102MA2A1L707H001X

排污单位名称：浙江三喜广告装饰有限公司

生产经营场所地址：丽水市莲都区水阁工业区枫岭街8号

统一社会信用代码：91331102MA2A1L707H

登记类型：首次 延续 变更

登记日期：2020年06月28日

有效期：2020年06月28日至2025年06月27日



注意事项：

（一）你单位应当遵守生态环境保护法律法规、政策、标准等，依法履行生态环境保护责任和义务，采取措施防治环境污染，做到污染物稳定达标排放。

（二）你单位对排污登记信息的真实性、准确性和完整性负责，依法接受生态环境保护检查和社会公众监督。

（三）排污登记表有效期内，你单位基本情况、污染物排放去向、污染物排放执行标准以及采取的污染防治措施等信息发生变动的，应当自变动之日起二十日内进行变更登记。

（四）你单位若因关闭等原因不再排污，应及时注销排污登记表。

（五）你单位因生产规模扩大、污染物排放量增加等情况需要申领排污许可证的，应按规定及时提交排污许可证申请表，并同时注销排污登记表。

（六）若你单位在有效期满后继续生产运营，应于有效期满前二十日内进行延续登记。



更多资讯，请关注“中国排污许可”官方公众微信号
